PantryPal

Your Kitchen's Best Friend

Η εφαρμογή που έρχεται να λύσει τα προβλήματα της διαχείρισης της αποθήκης και των πρώτων υλών σας.

Team Plan v0.1

Στην εργασία αυτή θα εργαστούν:

Κατσίρης Κωνσταντίνος-Νικόλαος 1051955
Μπίρμπας Παναγιώτης 1069365
Μπενετάτος Αλέξανδρος 1051949
Χριστακόπουλος Αναστάσιος 1048425

Εισαγωγή

Αποφασίσαμε σαν ομάδα να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο SCRUM. Η Scrum είναι μια επαναληπτική και αυξητική μεθοδολογία ανάπτυξης έργων. Χρησιμοποιείται σαν μια μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού, όσον αφορά την οργάνωση και λειτουργία των ομάδων ανάπτυξης αλλά και στον σχεδιασμό και διαχείριση των ευέλικτων έργων. Δεν υπάρχει σε αρχική φάση καμία ιεραρχία καθώς είμαστε στην φάση της αναγνώρισης των μελών μας και των δυνατοτήτων τους. Θα έχουμε έναν διαχειριστή (Scrum Master). Ο διαχειριστής της SCRUM είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ορθής ανάπτυξης του έργου σύμφωνα πάντα με τις πρακτικές, τις αξίες και τους κανόνες που έχουν καθοριστεί κατά το σχεδιασμό του. Για να επιτευχθεί αυτό, αλληλεπιδρά τόσο με την ομάδα ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Είναι επίσης υπεύθυνος στο να διασφαλίσει ότι τυχόν εμπόδια κατά τη διάρκεια του έργου θα εξαλειφθούν, έτσι ώστε η ομάδα ανάπτυξης να διατηρήσει όσο το δυνατόν ψηλότερα το επίπεδο παραγωγικότητάς της. Θα έχουμε μια ομάδα ανάπτυξης Scrum (Scrum Team). Η ομάδα Scrum είναι επιφορτισμένη με την ανάπτυξη του έργου και έχει την εξουσιοδότηση να αποφασίζει και να εκτελεί τις κατάλληλες διαδικασίες και εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση του. Τέλος θα έχουμε για αρχή μία Επανάληψη (Sprint) Υπολογίζουμε πως μέσα στην υλοποίηση του εξαμήνου θα έχουμε το πολύ δύο Sprints. Επανάληψη θεωρούμε έναν πλήρη κύκλο ανάπτυξης που περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, ανάλυση και υλοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων (sprint backlog).

Τρόπος επικοινωνίας

Η επικοινωνία μας μέχρι στιγμής γίνεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Discord. Έχει συσταθεί απο την πρώτη μέρα μια ομαδική συνομιλία ωστε να γίνονται με εύκολο και γρήγορο τρόπο τα απαραίτητα Direct Feedbacks όπως επίσης και Video Calls με την χρήση Share Screen οπου αυτό χρειάζεται.

Σύνθεση ομάδας

Ονοματεπώνυμο	Αριθμός Μητρώου	Έτος	Git hub username
Κατσίρης Κωνσταντίνος-Νικόλαος	1051955	9	TwoKdiN
Μπίρμπας Παναγιώτης	1069365	6	Panagiotis-Mpi
Μπενετάτος Αλέξανδρος	1051949	8	Sandro081997
Χριστακόπουλος Αναστάσιος	1048425	8	tasoschrist

Πλάνο ομάδας

Αρχικά δημιουργούμε το πλάνο δηλαδή συγκεντρώνουμε τα κομμάτια της εργασίας τα βάζουμε σε μια αρχική χρονολογική σειρά με κριτήριο τις ικανότητες των μελών της ομάδας αλλά και του χρόνου που μας παρέχεται για να αναπτύξουμε skills τα οποία δεν έχουμε. Στην πορεία ισως χρειαστεί να αλλάξουν τα task που αντιστοιχούν στο κάθε μέλος της ομάδας και ίσως αναθεωρηθεί και η χρονική διάρκεια μερικών απο αυτών. Σε πολλά απο αυτά σκοπεύουμε να δουλέψουμε συνεργατικά.

Βασικά εργαλεία

Το βασικά Εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί εως τώρα για το Team Plan είναι:
Για τα Pert και Gantt η εφαρμογή draw.io, Instagantt
Για τα mock-up screens χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή Figma
Για την σύνταξη των κειμένων το Word, Pages
Για την επικοινωνία των μελών το Discord
Για την παρακολουθηση της πορείας του project το Git-hub.

Διαγράμματα Gantt Pert

Τα διαγράμματα Gantt και Pert εχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπίπτουν με τα παραδοτέα μέσα στο εξάμηνο. Έχει θεωρηθεί πως κάθε μέρα είναι εργάσιμη και πως κάθε μέλος θα προσπαθήσει να ασχολείται με το κομμάτι που του έχει ανατεθεί κατα μέσο όρο 4 ώρες. Ελπίζουμε και με βάση τις υπόλοιπες υποχρεώσεις ως φοιτητές να καταφέρουμε να μείνουμε εντος του πλαισίο που έχουμε αρχικά σχεδιάσει.

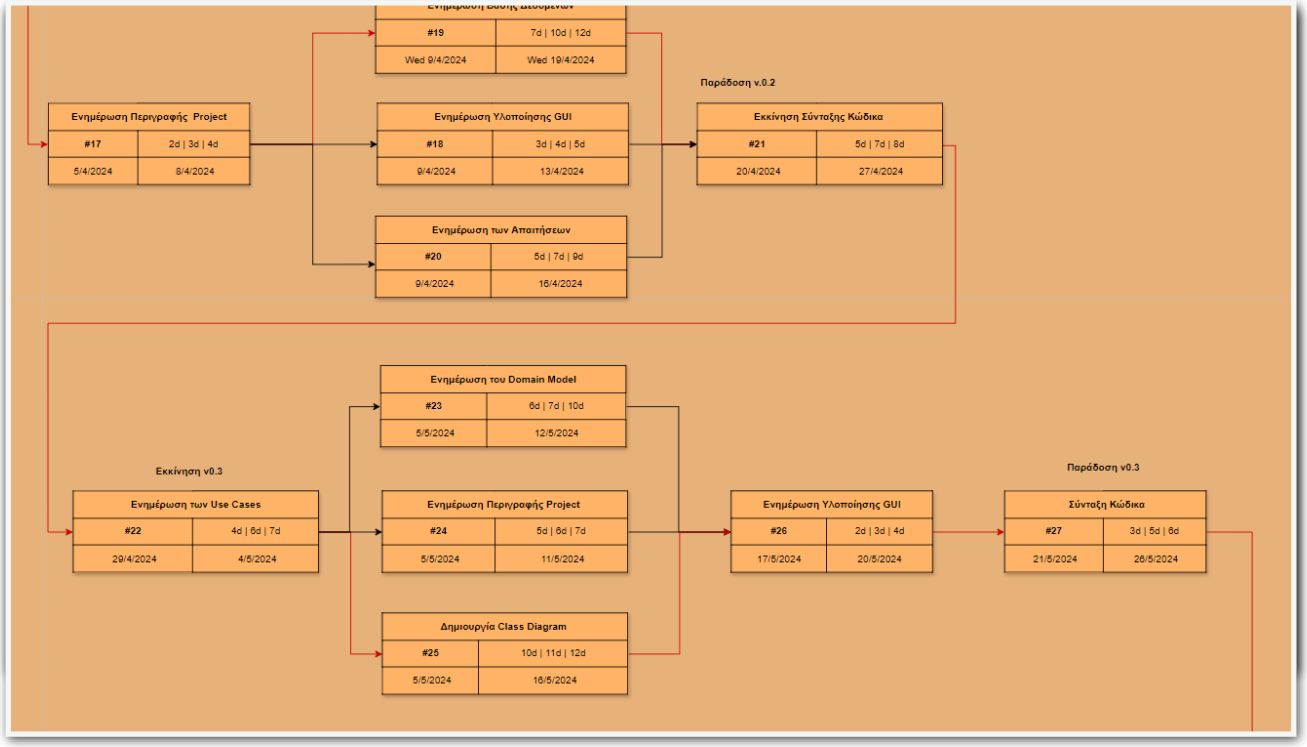

Εικόνα 2, Pert Chart

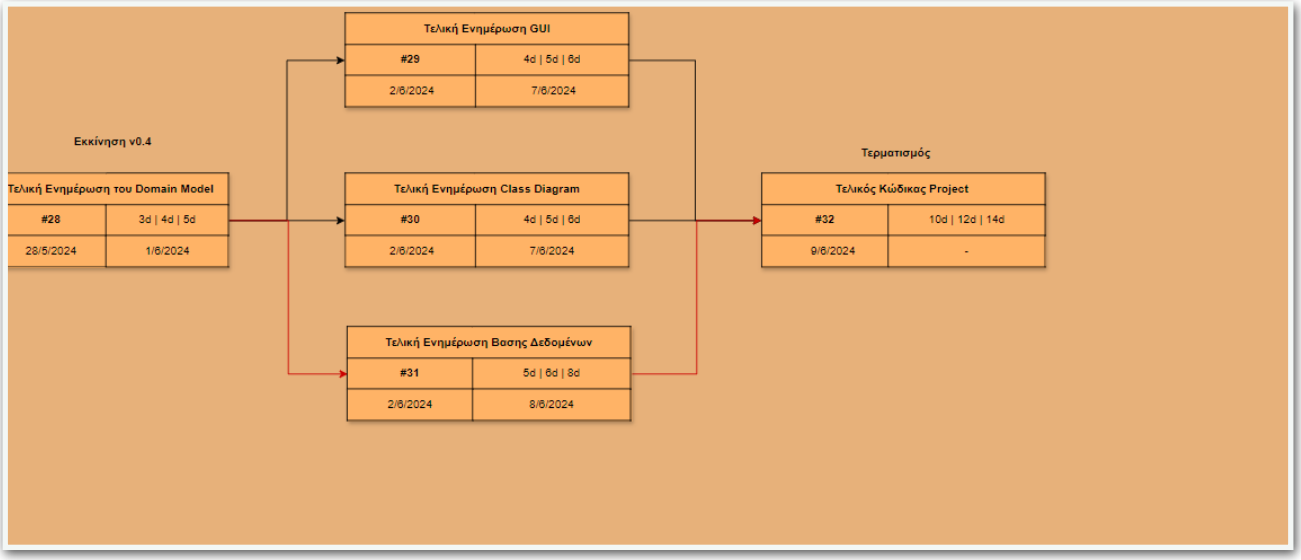

Εικόνα 3, Pert Chart

#	Task Name	Διάρκεια	Αρχή	Τέλος
1	Εξερεύνηση Ιδέας	3 days	1/3/2024	4/3/2024
2	Περιγραφή Project	2 days	5/3/2024	7/3/2024
3	Αξιολόγηση Κινδύνου	2 days	5/3/2024	7/3/2024
4	Συνάντηση με Επιχειρηματίες	2 days	8/3/2024	10/3/2024
5	Ανάλυση Απαιτήσεων	3 days	8/3/2024	12/3/2024
6	Μελέτη Παρόμοιων Υπηρεσιών	3 days	8/3/2024	11/3/2024
7	Δημιουργία των Use Cases	2 days	12/3/2024	14/3/2024
8	Δημιουργία των Charts	3 days	12/3/2024	15/3/2024
9	Αξιολόγηση Πλάνου	2 days	16/3/2024	18/3/2024
10	Δημιουργία Domain Model	4 days	19/3/2024	23/3/2024
11	Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων	4 days	24/3/2024	28/3/2024
12	Εκκίνηση Υλοποίησης GUI	3 days	24/3/2024	27/3/2024
13	Συνάντηση Ομάδας για Αξιολόγηση	2 days	29/3/2024	31/3/2024
-	1ο Παραδοτέο	-	-	-
14	Ενημέρωση/ Διόρθωση Domain Model	3 days	1/4/2024	4/4/2024
15	Σχεδίαση Sequence Diagrams	2 days	1/4/2024	3/4/2024
16	Σχεδίαση Robustness Diagrams	2 days	1/4/2024	3/4/2024
17	Ενημέρωση Περιγραφής Project	3 days	5/4/2024	8/4/2024
18	Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων	10 days	9/4/2024	19/4/2024
19	Ενημέρωση Υλοποίησης GUI	4 days	9/4/2024	13/4/2024
20	Ενημέρωση Απαιτήσεων	7 days	9/4/2024	16/4/2024
21	Εκκίνηση Σύνταξης Κώδικα	7 days	20/4/2024	27/4/2024
-	2ο Παραδοτέο	-	-	-
22	Ενημέρωση των Use Cases	5 days	29/4/2024	4/5/2024
23	Ενημέρωση του Domain Model	7 days	5/5/2024	12/5/2024
24	Ενημέρωση Περιγραφής Project	6 days	5/5/2024	11/5/2024
25	Δημιουργία Class Diagram	11 days	5/5/2024	16/5/2024
26	Ενημέρωση Υλοποίησης GUI	3 days	17/5/2024	20/5/2024
27	Σύνταξη Κώδικα	5 days	21/5/2024	26/5/2024
-	3ο Παραδοτέο	-	-	-
28	Τελική Ενημέρωση του Domain Model	4 days	28/5/2024	1/6/2024
29	Τελική Ενημέρωση GUI	5 days	2/6/2024	7/6/2024
30	Τελική Ενημέρωση Class Diagram	5 days	2/6/2024	7/6/2024
31	Τελική Ενημέρωση Βάσης Δεδομένων	6 days	2/6/2024	8/6/2024
32	Τελικός Κώδικας Project	12 days	9/6/2024	-
-	4ο Παραδοτέο	-	-	-

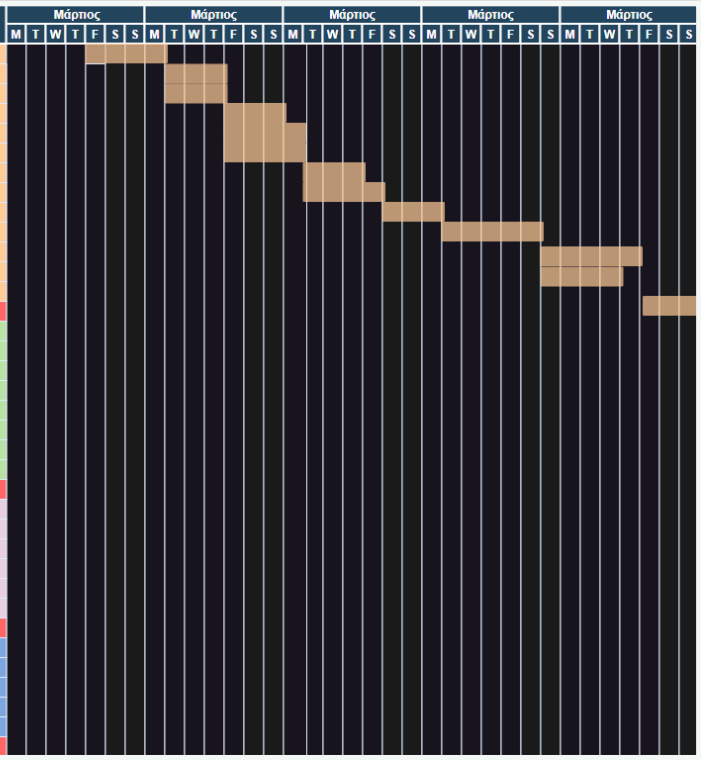

Εικόνα 4, Gantt Chart

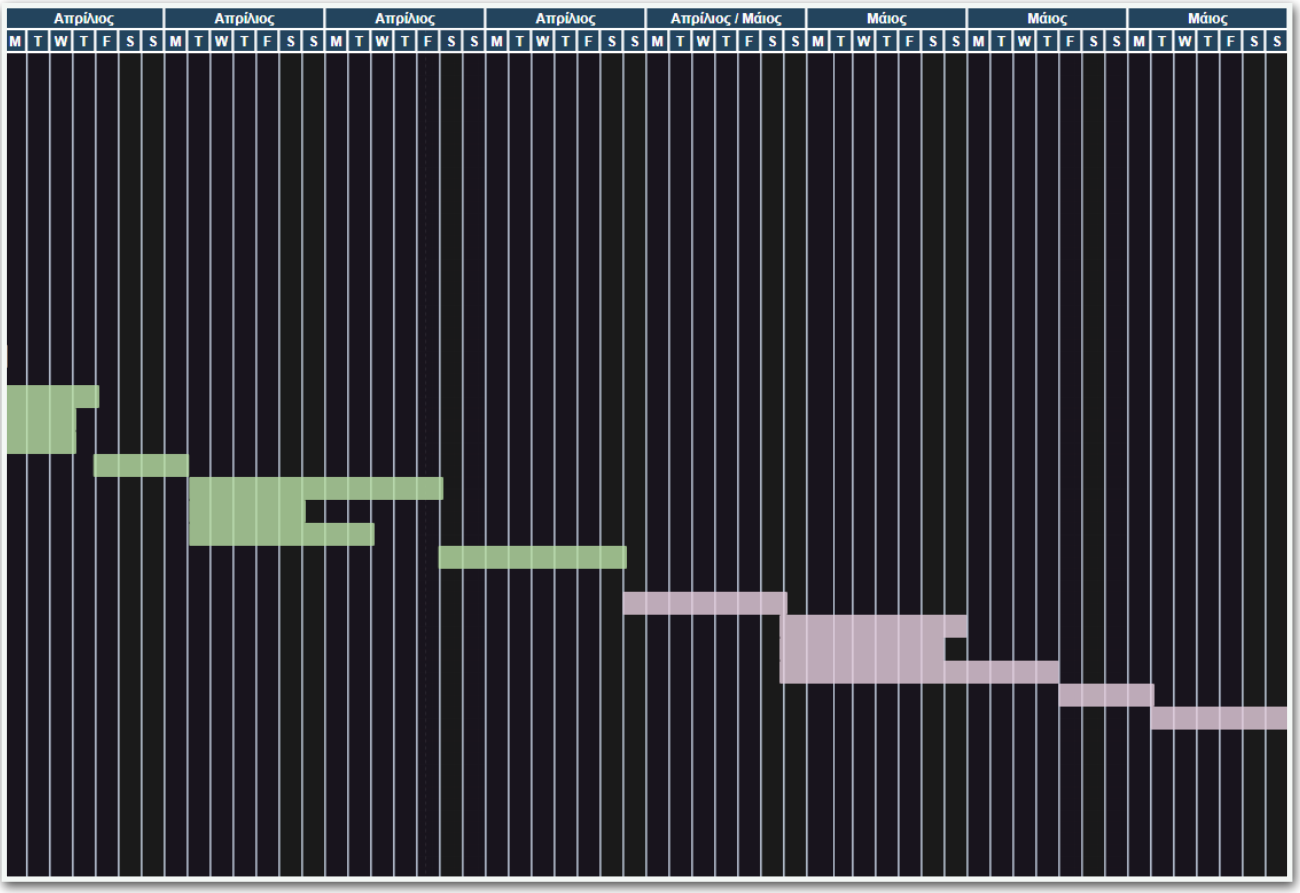

Εικόνα 5, Gantt Chart

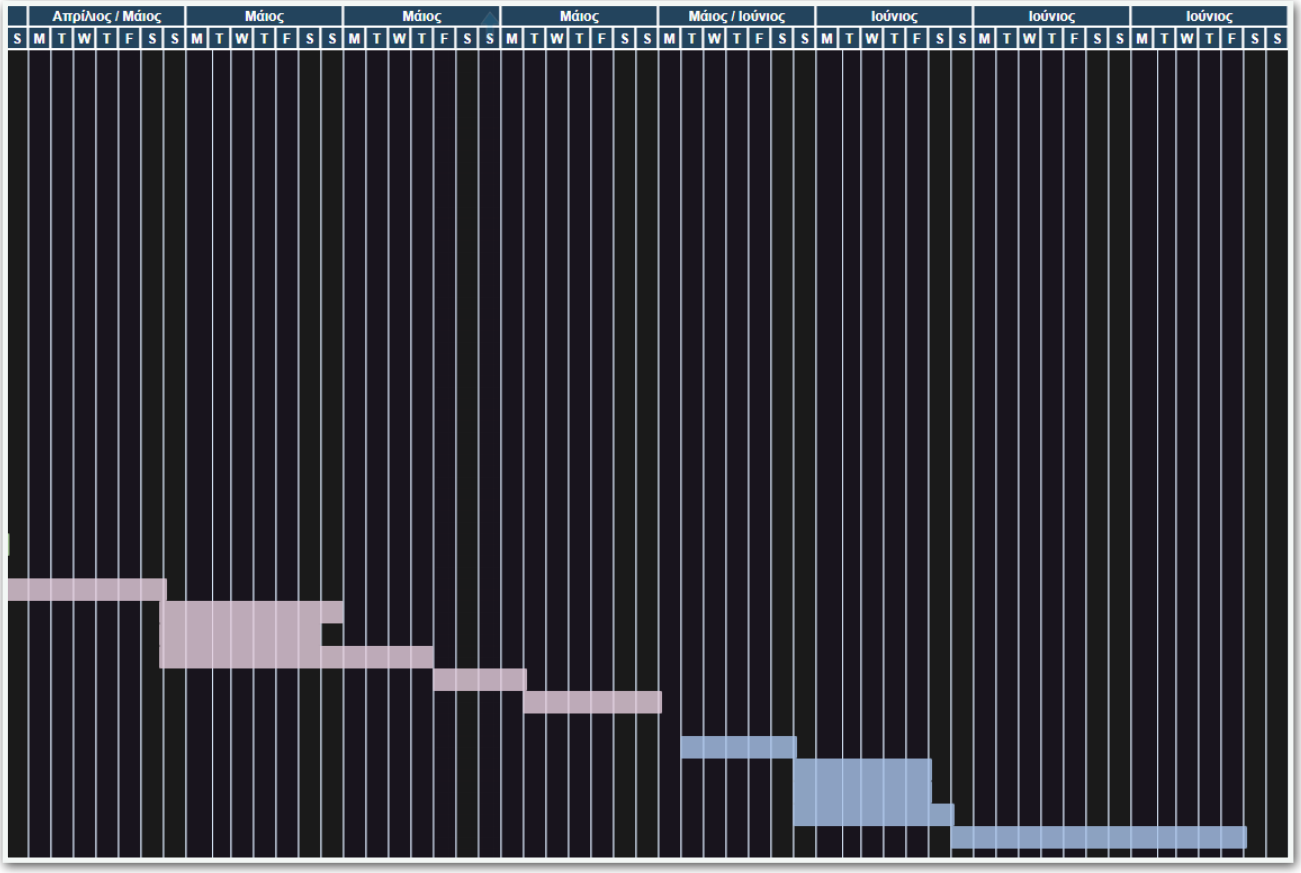

Εικόνα 6, Gantt Chart

Κατανομή προσπάθειας

Η ομάδα συμφώνησε ώστε η κατανομή να γίνει ως εξής:

Όνομα	Ποσοστό συμμετοχής
Κατσίρης Κωνσταντίνος-Νικόλαος	0.40
Μπίρμπας Παναγιώτης	0.30
Μπενετάτος Αλέξανδρος	0.10
Χριστακόπουλος Αναστάσιος	0.20

Σύνδεσμος Git-Hub project

https://github.com/Panagiotis-Mpi/Pantry-Pal/branches
